



Інклюзивний дитячий майданчик

Чередніченко Анастасія

ЕКБ-1-18-4.0д

В Оболонському районі багато дітей з обмеженими можливостями, а спеціально обладнаних для них майданчиків немає.

Рішенням даної проблеми є проект не тільки сучасного та безпечного майданчика, а ще й інклюзивного, тобто тут можуть гратися і спілкуватися звичайні діти разом з дітьми з ментальними або фізичними порушеннями. Адже сприйняття людей з інвалідністю потрібно виховувати змалку. До того ж інклюзія потрібна не тільки людям з особливостями розвитку – адже необхідно навчитися приймати факт, що хоч усі ми різні, але можемо спілкуватися, дружити і відпочивати разом. Роблячи майданчик інклюзивним прагнемо прищепити це розуміння і дітям, і дорослим.






Дитячий майданчик буде розміщений на території Київської міської дитячої клінічної лікарні № 1 в Оболонському районі міста Києва.
(вулиця Богатирська, 30)





На території лікарні є вільна територія, яку можна було б використовувати з користю.

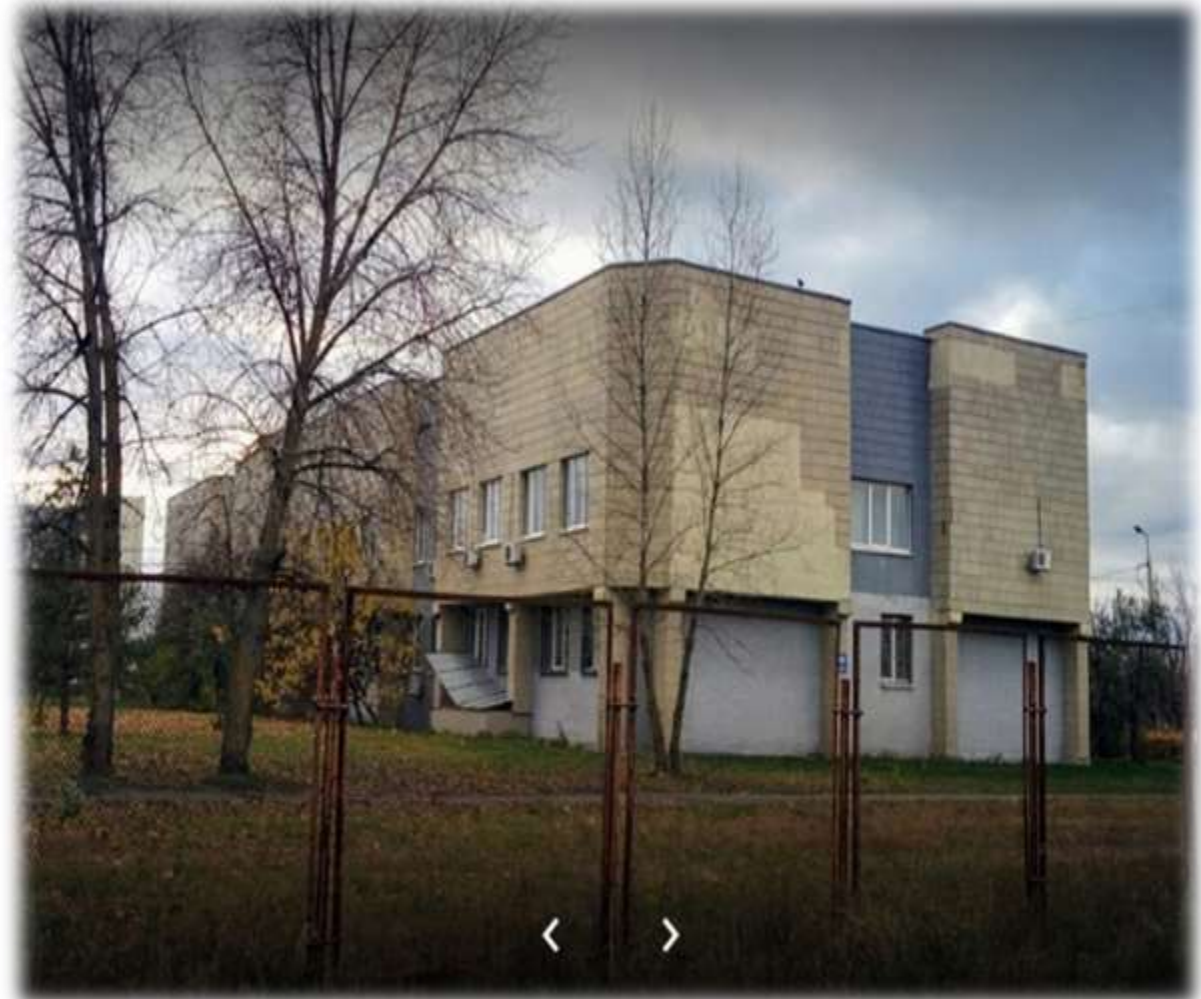

Асоціації школярів старших класів на слова «Людина з обмеженими МОЖЛИВОСТЯМИ».




Після аналізу опитування були отримані такі результати:

- Найчастіше людину з обмеженими можливостями асоціюють зі словом «інвалід» – 60%;
- Також, уявляють її як людину сильну духом, нещасну, неповноздатну, та таку, що викликає жалість – 25%;
- У свідомості старшокласників людина з обмеженими можливостями також є самотньою, замученою, має потребу у спілкуванні та викликає почуття, яке наштовхує на допомогу – 10%;
- Решта асоціацій мають незначну кількість повторень – 5%.

Найчастіше підлітки по відношенню до людей з обмеженою відповідальність вживають такі слова: «з вадами здоров'я», «обмежені можливості», «жалість», «неповно здатна», «самотня», «потреба у спілкуванні», «хочеться допогти».

І все рідше вживаються слова – «кульгає», «криві ноги, руки», «не красива», «не така як всі».





Ідентифікація учасників проекту

Ініціатор проекту	Батьки дітей з обмеженими можливостями
Замовник	Депутат Київради Турець Владислав Володимирович
Власник проекту	Адміністрація реабілітаційного центру Київської міської дитячої клінічної лікарні №1
Інвестори	Депутат Київради Турець Владислав Володимирович
Конкуренти основних учасників проекту	-
Органи влади	Адміністрація Оболонського району міста Києва; Депутат Турець Владислав Володимирович
Ліцензіари	Адміністрація Оболонського Району міста Києва
Громадські групи і організації, населення	Діти з обмеженими можливостями, діти, батьки
Підрядники/Поставщики	Буд. компанія «PAPASTROY»; Компанія «Захід Мастерфайбр»; Компанія «elitePARK»; Компанія «SPIRIT COMPANY»; Компанія «SHERIFF»; Компанія «Клуб рослин»; «Леруа Мерлен»
Інші зацікавлені сторони	Інструктор від реабілітаційного центру.
Споживачі кінцевої продукції проекту	Діти з обмеженими можливостями, діти, батьки
Автор проекту	Чередніченко Анастасія
Команда проекту	Менеджер проекту Підрядники

Визначення цілей проекту





Вимогами до кінцевого результату проекту є:

№	Назва вимоги
1	Забезпечення безпеки знаходження дітей на майданчику (всі інженерні вимоги виконані правильно)
2	Вимога скільки людей може бути одночасно на майданчику (20 осіб – 10 інструкторів і 10 дітей)
3	Інструктор до кожної дитини
4	Зроблено з екологічних матеріалів, не шкодить довкіллю
5	Зручність для мешканців, комфортність
6	Розвиток і вдосконалення фізичних і духовних якостей особистості дитини
7	Пропаганда здорового способу життя
8	Формування почуття колективізму, спільної ігрової діяльності



Декомпозиція кінцевого результату проекту



Розробка СДР проекту та побудова мережевої діаграми

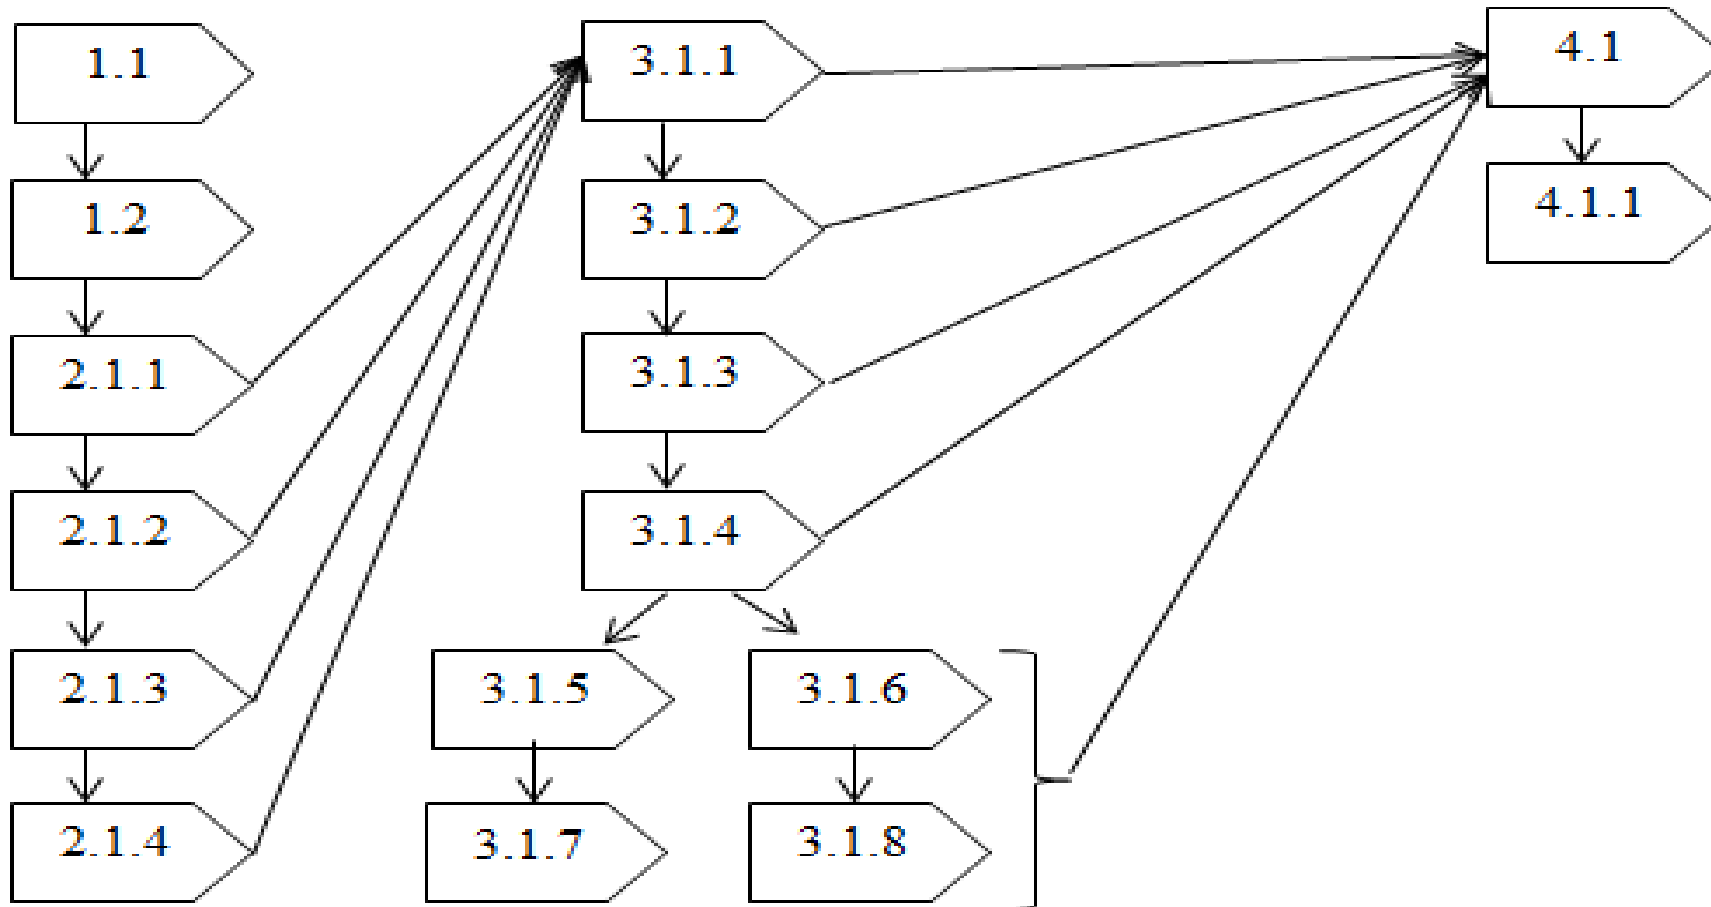


Рис. 4.1. Мережева діаграма



Фази проекту

№ фази	Назва	Критерії переходу на іншу фазу	Оцінка тривалості	Оцінка вартості*
1.	Ініціація проекту	1. Наказ про відкриття проекту.	11 днів/ 88 год	
2.	Планування	1. Складання графіку робіт та графіку виконання. 2. Домовленості з поставниками та будівельними фірмами. 3. Підписання договорів з фірмами.	4 дні/ 32 год (з/п менеджера за весь проект)	100 000 грн
3.	Виконання	1. Вирівнювання території. 2. Доставка буд.матеріалів. 3. Виконання робіт. 4. Прибирання території.	14 днів/ 112 год	852 000 грн
4.	Оцінка результатів	1. Експертна оцінка.	1 день/ 8 год	5 000 грн
5.	Відкриття	1. Відкриття майданчику. 2. Передача на баланс реабілітаційного центру.	1 день/ год	1 000 грн
Всього проект			31 день/ 248 год	958 000 грн



Контрагентами проекту є:

№	Назва ресурса	Оцінка кількості (договори)	Оцінка вартості*
1	За домовленістю компанія «PAPASTROY»	1	20 000 грн
2	За домовленістю компанія «Захід Мастерфайбр»	1	25 000 грн
3	За домовленістю компанія «elitePARK»	1	600 000 грн
4	За домовленістю компанія «SPIRIT COMPANY»	1	150 000 грн
5	За домовленістю компанія «SHERIFF»	1	15 000 грн
6	За домовленістю компанія «Клуб рослин»	1	30 000 грн
7	За домовленістю з компанія «LEROY MERLIN»	1	12 500 грн
	ВСЬОГО	7	852 000 грн

Тренажерний майданчик для дітей з обмеженими можливостями





Майданчик для дітей з обмеженими можливостями





На даному майданчику всі діти будуть проводити час з користю – дихати свіжим повітрям, виконувати фізичні вправи під наглядом інструктора (реабілітуватися) та просто спілкуватися та гратися з друзями.

Він просто необхідний для соціалізації, розвитку, оздоровлення та звичайно позитивних емоцій діткам з особливими потребами. Також, такий майданчик популяризує здоровий спосіб життя та любов до спорту.





Дякую за увагу!
