




**КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА**

Облаштування майданчика для вигулу та дресирування собак Дніпровського району міста Києва


Буждиган Катерина




Схема 1. Учасники проекту

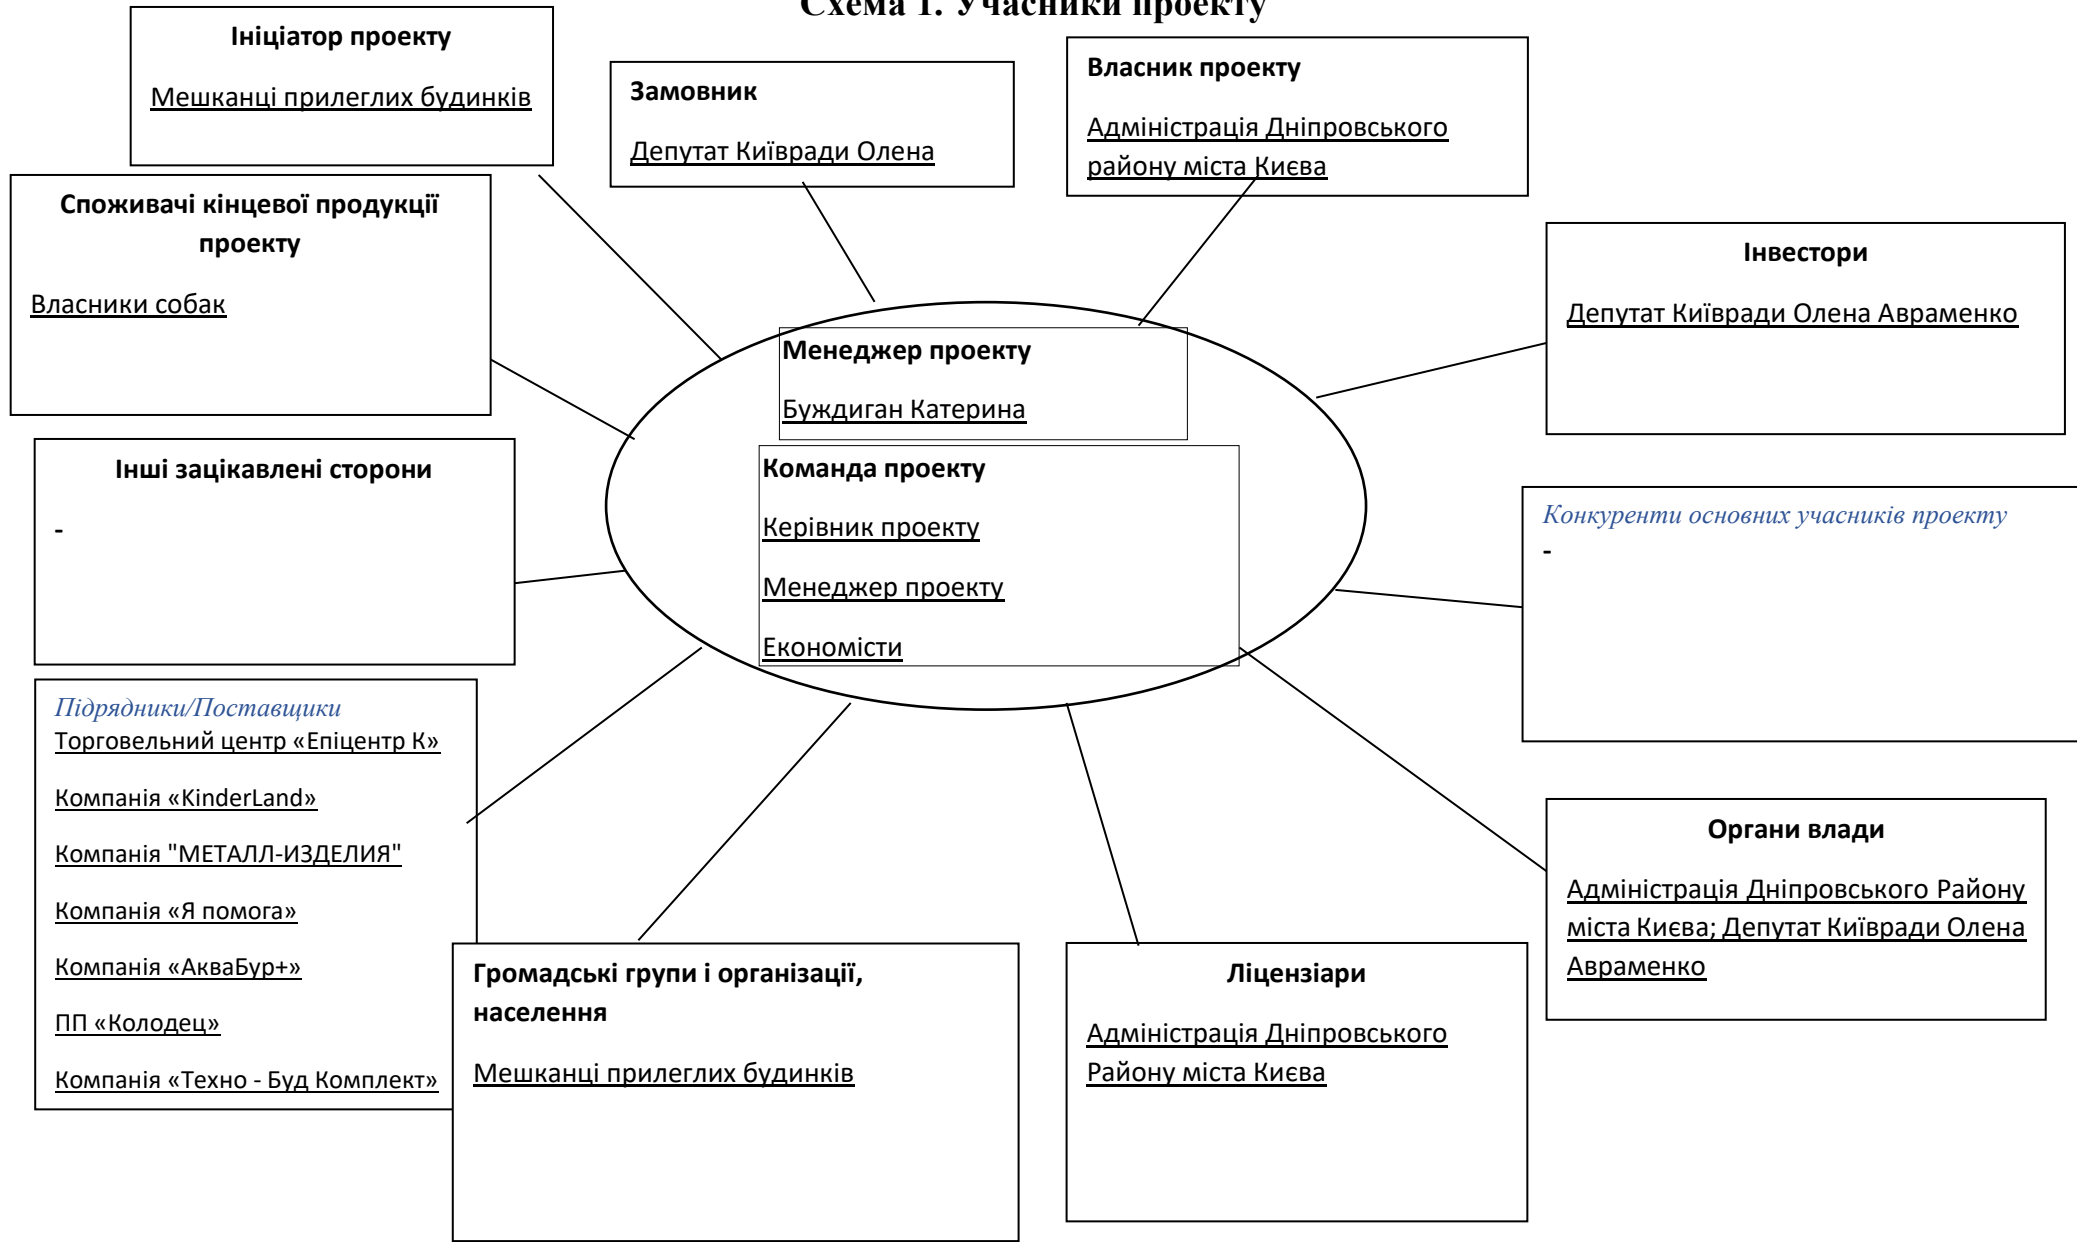

Мапа проекту

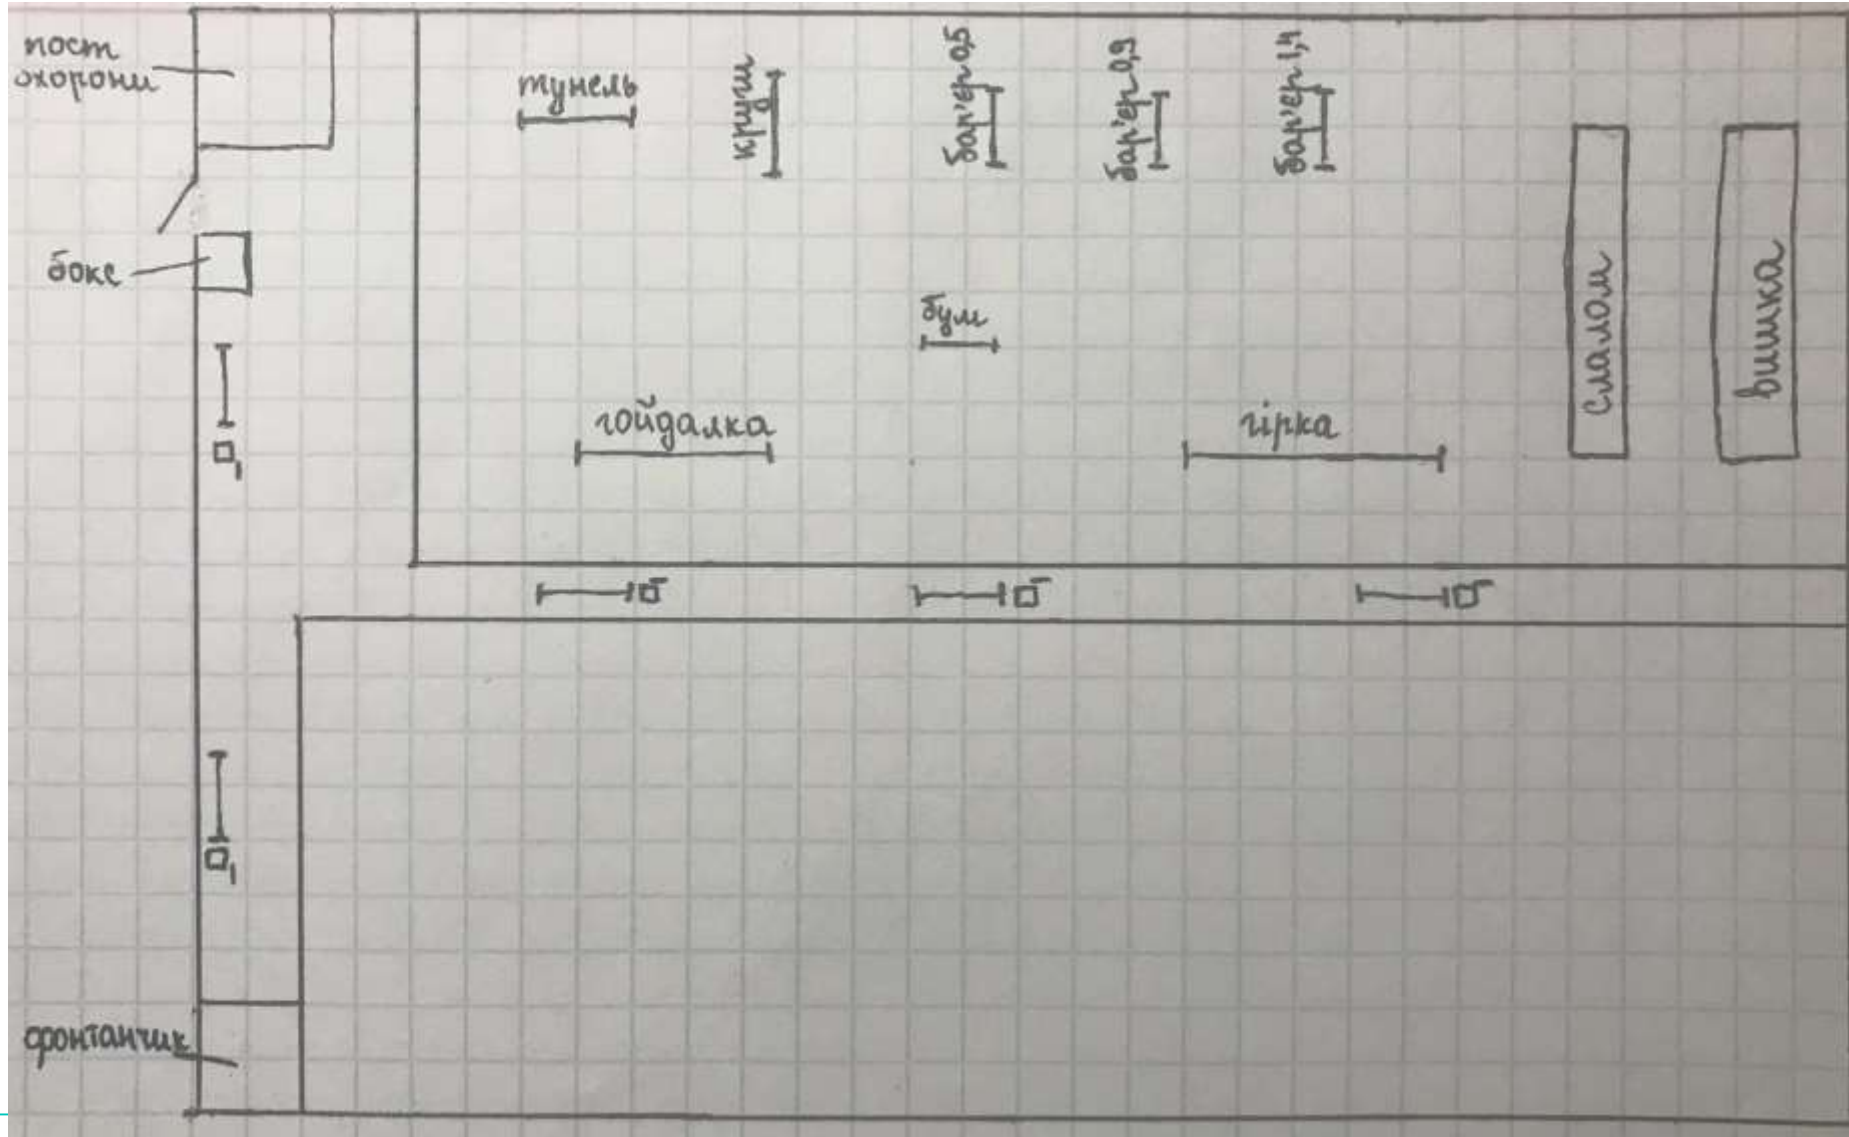

Зона для тренування

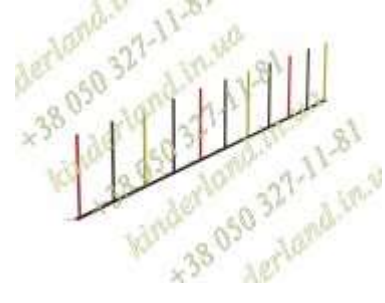


Загальна зона



200
штук

Стимул до прибирання

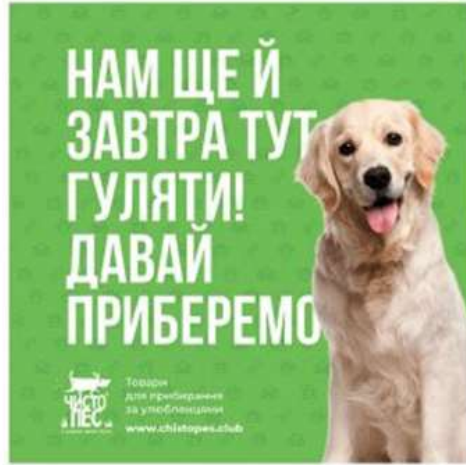



СДР проекта

№ 1-го рівня	№ 2-го рівня	№ 3-го рівня	Назва задачі	Оцінка тривалості	Ресурси	Оцінка вартості
1.			Обговорення побажань та очікувань з громадою		T2	750
	1.1		Оцінка можливості монтування майданчику для дресирування та вихову собак		T1, T2	1000+750=1 750
		1.1.1	Розробка проекту	1 тиждень/ 40 год	T1, T2, T3, T4	1000+750+600+600=2 950
		1.1.2	Затвердження проекту депутатом	3 день/ 24 год	T1	1 000
		1.1.3	Затвердження проекту адміністрацію Дніпровського району	1 тиждень/ 40 год	T1	1 000
2.			Планування поставок			
		2.1.1	Планування поставок буд матеріалів	2 день/ 16 год	T2	750
		2.1.2	Планування поставок зелених насаджень	1 день\ 8 годин	T2	750
		2.1.3	Планування поставок тренажерів та лавочок	1 день\ 8 годин	T3	600
		2.1.4	Планування поставок системи спостереження	1 день\ 8 годин	T3	600
		2.1.5	Планування поставки посту охорони та боксу «Я помога»	1 день\ 8 годин	T3	600
		2.1.6	Планування поставок смітників, контейнерів для біопакетів, пакетів та інформаційних табличок	2 день\ 16 годин	T4	600
		2.1.7	Планування поставки ноутбука, стола та стільця	1 день\ 8 годин	T4	600

	3.1.1	Встановлення тимчасової огорожі	2 день\ 8 годин	T1, T2, M1	$1000*2+750*2+2\ 050=5\ 550$
	3.1.2	Буріння свердловини	4 день\ 8 годин	T1, T2, M6	$1000*4+750*4+27\ 000=34\ 000$
	3.1.3	Риття каналізації	3 день\ 8 годин	T1, T2, M7	$1000*3+750*3+15\ 000=20\ 250$
	3.1.3	Встановлення фонтанчику	1 день\ 8 годин	T1, T2, M8, M9	$1000+750+1500+7786=11\ 036$
	3.1.4	Вирівнювання території	2 день\ 8 годин	T1, T2, M10	$1000*2+750*2+21\ 000=24\ 500$
	3.1.5	Встановлення стовпів для огорожі	4 день\ 8 годин	T1, T2, M1, M3	$1000*4+750*4+4510+13563=25\ 073$
	3.1.6	Викладення плитки	1 тиждень\ 40 годин	T1, T2, M11, M12, M13, M14	$1000*5+750*5+1440+27720+28939$ $+4484=71\ 333$
	3.1.7	Встановлення посту охорони та боксу	4 день\ 8 годин	T1, T2, M15, M16	$1000*4+750*4+35000+50000=$ $92\ 000$
	3.1.8	Монтаж обладнання, лавочок, смітників, інформаційних табличок та контейнерів з біопакетами.	1 тиждень\ 40 годин	T1, T2, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23, M24, M25, M26, M27, M28, M29, M30, M31, M32	$1000*5+750*5+40000+14750+$ $5055+415+520+450+13800+4850+$ $4950+6100+7500+5450+$ $42550+17850+6800=179\ 790$
	3.1.9	Заповнити піском майданчику для дресирування собак	1 день\ 8 годин	T1, T2, M33, M34	$1000+750+3000+20565=25\ 315$
	3.1.10	Засадження травою майданчика для вигулу собак	1 день\ 8 годин	T1, T2, M35, M36	$1000+750+3000+1170=5\ 920$
	3.1.11	Встановлення камер відеоспостереження	1 день\ 8 годин	T1, T2, M37, M38, M39	$1000+750+6300+12480+2100=$ $22\ 630$
	3.1.12	Встановлення комп'ютера, стола, стільця та освітлення.	1 день\ 8 годин	T1, T2, M40, M41, M42, M43	$1000+750+500+20000+$ $1450+654=24\ 354$
	3.1.13	Встановлення секцій огорожі та калитки.	4 день\ 16 годин	T1, T2, M1, M2, M4, M5	$1000*4+750*4+4510+19920+$ $1066+6313=38\ 809$
4		Завершення			
	4.1.1	Експертна оцінка, передана на баланс	1 день\ 8 годин	T1, T2, T3, T4, M44	$1000+750+600+600+7000=3\ 650$



Людські ресурси

№	Назва ресурса	Оцінка вартості, грн.
T1	Керівник проекту	47 000
T2	Менеджер проекту	35 250
T3	Економіст 1	28 200
T4	Економіст 2	28 200
Всього		135 650



Матеріальні ресурси

№	Назва ресурса	Оцінка кількості	Оцінка вартості, грн.
M1	Догорів про встановлення огорожі та калитки	1	11 070
M2	Секція огорожі 2,03*2,5 м	40	19 920
M3	Стовп для огорожі 2 м	41	13 563
M4	Кріплення	82	1 066
M5	Хвіртка	1	6 313
M6	Договір про буріння свердловини	1	27 000
M7	Договір про риття каналізації	1	15 000
M8	Договір про встановлення фонтанчику	1	1 500
M9	Фонтанчик питний вуличний	1	7 786
M10	Договір про вирівнювання території	1	21 000
M11	Договір про викладення плитки	1	11 440
M12	Плитка	88 м2	27 720
M13	Щебінь, 30 кг	673	28 939
M14	Відсів, 25 кг	236	4 484
M15	Пост охорони	1	35000
M16	Бокс «Я допомога»	1	50000
M17	Договір на монтажні роботи	1	40 000
M18	Лавочки	5	14 750
M19	Смітники	5	5 055
M20	Контейнери для біопакетів	5	415
M21	Біопакети	2	520
M22	Інформаційні таблички	5	450
M23	Тунель	1	13 800



Матеріальні ресурси

M24	Снаряд «Круги»	1	4 850
M25	Бар'єр 0,5 м	1	4 950
M26	Бар'єр 0,9 м	1	6 100
M27	Бар'єр 1,4 м	1	7 500
M28	Слалом	1	5 450
M29	Вишка	1	42 550
M30	Гірка	1	17 850
M31	Бум	1	15 300
M32	Гойдалка-балансир	1	6 800
M33	Договір на засипання піску	1	3 000
M34	Пісок (256 м2), т	45,7	20 565
M35	Договір на озеленення зони для виходу собак	1	3 000
M36	Трава(252 м2), уп.	9	1 170
M37	Договір на встановлення камер	1	6 300
M38	Камери відеоспостереження, шт	8	12 480
M39	Провода, м	150	2 100
M40	Договір на підключення камер до комп'ютера	1	500
M41	Ноутбук	1	20 000
M42	Стіл	1	1 450
M43	Стілець	1	654
M44	Експлуатаційна оцінка	1	7 000
M45	Непередбачувані витрати	1	70 000
Всього			616 360



Дякую за увагу!
